



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi - Ma. Bulian Km 16 Simp. Sei Duren Kab. Muaro Jambi Telp (0741) 583183-584118

LAPORAN PROGRES KEMAJUAN PEKERJAAN

Pekerjaan :

Renovasi Student Center

Kontrak

B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026

Lokasi :

Kabupaten Muaro Jambi

Tahun Anggaran :

2026

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI



CV. ANUGRAH

CV. ANUGRAH

Jasa Pelaksana Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha : BG002, BG006, BS001, BS004
Jl. Padang Lamo Kelurahan Pulau Temiang RT. 02 RW. 01 Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo Provinsi Jambi
Email : cvanugrah161618@gmail.com
No. Rek BANK BPD : 3003095998

LAPORAN PROGRESS BULANAN PEKERJAAN

Unit Kerja : Uin STS Jambi
Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tanggal Kontrak : 6/11/26
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
Nilai Kontrak : Rp 179.899.431,00
Tahun Anggaran : 2026

Bulan ke : 1
Tanggal : 6/11/26 s/d 7/5/26

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Hasil Pelaksanaan Pekerjaan						
		Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot %	Bulan Lalu		Bulan Ini		Tot s/d Bulan Ini		(%)
							Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	1,00	480.000,00	480.000,00	0,30	-	-	1,00	0,30	1,00	0,30	100,00
2	Pek. Papan Proyek	Ls	1,00	90.000,00	90.000,00	0,06	-	-	1,00	0,06	1,00	0,06	100,00
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,62	-	-	1,00	0,62	1,00	0,62	100,00
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing	Bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00	1,11	-	-	4,00	1,11	4,00	1,11	100,00
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	1,00	0,25	1,00	0,25	100,00
B	PEKERJAAN ATAP DAN DINDING												
1	Pek. Pengecatan Dinding Permukaan Lama	M2	1.785,89	34.000,00	60.720.260,00	37,47	-	-	1.725,00	36,19	1.725,00	36,19	96,59
2	Pek. Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	167,51	62.000,00	10.385.620,00	6,41	-	-	125,00	4,78	125,00	4,78	74,62
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	M2	26,41	158.000,00	4.172.780,00	2,57	-	-	23,00	2,24	23,00	2,24	87,09
4	Pek. Pasangan Nok Atap	M1	20,76	99.000,00	2.055.240,00	1,27	-	-	11,00	0,67	11,00	0,67	52,99
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm	M2	6,52	168.000,00	1.095.360,00	0,68	-	-	6,52	0,68	6,52	0,68	100,00
6	90% Rangka Eksisting, 10% Rangka Baru (Kayu kelas II)												
6	Pek. Memasang Rangka-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	M2	65,16	80.000,00	5.212.800,00	3,22	-	-	60,00	2,96	60,00	2,96	92,08
7	Pek. Pengecatan Plafond	M2	680,54	34.000,00	23.138.360,00	14,28	-	-	665,00	13,95	665,00	13,95	97,72
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI												
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif	M2	23,88	285.000,00	6.805.800,00	4,20	-	-	12,00	2,11	12,00	2,11	50,25
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished	M2	65,46	379.000,00	24.809.340,00	15,31	-	-	25,00	5,85	25,00	5,85	38,19
3	Pek. Kloset Jongkok Porselen	Bh	4,00	700.000,00	2.800.000,00	1,73	-	-	2,00	0,86	2,00	0,86	50,00
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3"	M1	18,00	139.000,00	2.502.000,00	1,54	-	-	6,00	0,51	6,00	0,51	33,33
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2"	M1	48,00	38.000,00	1.824.000,00	1,13	-	-	18,00	0,42	18,00	0,42	37,50
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,37	-	-	2,00	0,12	2,00	0,12	33,33
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless	Bh	6,00	85.000,00	510.000,00	0,31	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05	16,67
D	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN												
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	1,00	230.000,00	230.000,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih	Bh	10,00	165.000,00	1.650.000,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Stop Kontak	Bh	2,00	155.000,00	310.000,00	0,19	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,56	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2	M2	2,60	1.000.000,00	2.600.000,00	1,60	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle)	Bh	4,00	575.000,00	2.300.000,00	1,42	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu	Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pull Handle Pintu	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-
F	PEKERJAAN LAIN LAIN												
1	Pek. Sewa Scaffolding	Ls	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	1,00	0,68	1,00	0,68	100,00
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL FISIK					162.071.560,00	100,00				74,41		74,41	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn 11 % x A)					17.827.871,60								60,39
JUMLAH + PPN					179.899.431,60								74,41
DIBULATKAN					179.899.431,00								14,02

Disetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dr. Junaldi, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 19700227 199703 1 002

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Trihanda Konsultan

CV. CAKRA TRIHANDA KONSULTAN
Yudi Setiawan, SH
Direktur

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
CV. Anugrah

CV. ANUGRAH
Ronat Mardyaswan
Direktur

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN PEKERJAAN

Unit Kerja : Uin STS Jambi
Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tanggal Kontrak : 6/11/26
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
Nilai Kontrak : Rp 179.899.431,00
Tahun Anggaran : 2026

Minggu : 1
Tanggal : 6/11/26 s/d 6/14/26

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Hasil Pelaksanaan Pekerjaan						
		Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot %	Minggu Lalu		Minggu Ini		Tot s/d Minggu ini		(%)
							Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	1,00	480.000,00	480.000,00	0,30	-	-	1,00	0,30	1,00	0,30	100,00
2	Pek. Papan Proyek	Ls	1,00	90.000,00	90.000,00	0,06	-	-	1,00	0,06	1,00	0,06	100,00
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,62	-	-	1,00	0,62	1,00	0,62	100,00
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing	Bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	1,00	0,25	1,00	0,25	100,00
B	PEKERJAAN ATAP DAN DINDING												
1	Pek. Pengecatan Dinding Permukaan Lama	M2	1.785,89	34.000,00	60.720.260,00	37,47	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	167,51	62.000,00	10.385.620,00	6,41	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	M2	26,41	158.000,00	4.172.780,00	2,57	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Nok Atap	M1	20,76	99.000,00	2.055.240,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm	M2	6,52	168.000,00	1.095.360,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-
6	90% Rangka Eksisting, 10% Rangka Baru (Kayu kelas II)												
6	Pek. Memasang Langit-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	M2	65,16	80.000,00	5.212.800,00	3,22	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengecatan Plafond	M2	680,54	34.000,00	23.138.360,00	14,28	-	-	-	-	-	-	-
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI												
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif	M2	23,88	285.000,00	6.805.800,00	4,20	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished	M2	65,46	379.000,00	24.809.340,00	15,31	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Kloset Jongkok Porselen	Bh	4,00	700.000,00	2.800.000,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3"	M1	18,00	139.000,00	2.502.000,00	1,54	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2"	M1	48,00	38.000,00	1.824.000,00	1,13	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless	Bh	6,00	85.000,00	510.000,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-
D	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN												
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	1,00	230.000,00	230.000,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih	Bh	10,00	165.000,00	1.650.000,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Stop Kontak	Bh	2,00	155.000,00	310.000,00	0,19	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,56	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2	M2	2,60	1.000.000,00	2.600.000,00	1,60	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle)	Bh	4,00	575.000,00	2.300.000,00	1,42	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu	Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pull Handle Pintu	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-
F	PEKERJAAN LAIN LAIN												
1	Pek. Sewa Scaffolding	Ls	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL FISIK					162.071.560,00	100,00				1,22		1,22	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN 11 % x A)					17.827.871,60								1,89
JUMLAH + PPN					179.899.431,60								1,22
DIBULATKAN					179.899.431,00								(0,68)

Disetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dr. Junaldi, S. Ag., M. Pd., I.
NIP. 19700227 199703 1 002

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Trihanda Konsultan

Yudi Setiawan, SH
Direktur

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
CV. Anugrah

Ronal Mardiaswan
Direktur

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN PEKERJAAN

Unit Kerja : Uin STS Jambi
Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tanggal Kontrak : 6/11/26
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
Nilai Kontrak : Rp 179.899.431,00
Tahun Anggaran : 2026

Minggu : 2
Tanggal : 6/15/26 s/d 6/21/26

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Hasil Pelaksanaan Pekerjaan						
		Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot %	Minggu Lalu		Minggu Ini		Tot s/d Minggu ini		(%)
							Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	1,00	480.000,00	480.000,00	0,30	1,00	0,30	-	-	1,00	0,30	100,00
2	Pek. Papan Proyek	Ls	1,00	90.000,00	90.000,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06	100,00
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,62	1,00	0,62	-	-	1,00	0,62	100,00
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing	Bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00	1,11	-	-	2,00	0,56	2,00	0,56	50,00
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	1,00	0,25	-	-	1,00	0,25	100,00
B	PEKERJAAN ATAP DAN DINDING												
1	Pek. Pengecatan Dinding Permukaan Lama	M2	1.785,89	34.000,00	60.720.260,00	37,47	-	-	510,00	10,70	510,00	10,70	28,56
2	Pek. Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	167,51	62.000,00	10.385.620,00	6,41	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	M2	26,41	158.000,00	4.172.780,00	2,57	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Nok Atap	M1	20,76	99.000,00	2.055.240,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm	M2	6,52	168.000,00	1.095.360,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-
6	90% Rangka Eksisting, 10% Rangka Baru (Kayu kelas II)												
6	Pek. Memasang Langit-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	M2	65,16	80.000,00	5.212.800,00	3,22	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengecatan Plafond	M2	680,54	34.000,00	23.138.360,00	14,28	-	-	140,00	2,94	140,00	2,94	20,57
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI												
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif	M2	23,88	285.000,00	6.805.800,00	4,20	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished	M2	65,46	379.000,00	24.809.340,00	15,31	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Kloset Jongkok Porselen	Bh	4,00	700.000,00	2.800.000,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3"	M1	18,00	139.000,00	2.502.000,00	1,54	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2"	M1	48,00	38.000,00	1.824.000,00	1,13	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless	Bh	6,00	85.000,00	510.000,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-
D	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN												
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	1,00	230.000,00	230.000,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih	Bh	10,00	165.000,00	1.650.000,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Stop Kontak	Bh	2,00	155.000,00	310.000,00	0,19	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,56	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2	M2	2,60	1.000.000,00	2.600.000,00	1,60	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle)	Bh	4,00	575.000,00	2.300.000,00	1,42	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu	Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pull Handle Pintu	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-
F	PEKERJAAN LAIN LAIN												
1	Pek. Sewa Scaffolding	Ls	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	1,00	0,68	1,00	0,68	100,00
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL FISIK					162.071.560,00	100,00		1,22		14,87		16,09	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN 11 % x A)					17.827.871,60								11,82
JUMLAH + PPN					179.899.431,60								16,09
DIBULATKAN					179.899.431,00								4,27

Disetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Ulin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Trihanda Konsultan



Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
CV. Anugrah



LAPORAN PROGRESS MINGGUAN PEKERJAAN

Unit Kerja : Uin STS Jambi
Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tanggal Kontrak : 6/11/26
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
Nilai Kontrak : Rp 179.899.431,00
Tahun Anggaran : 2026

Minggu : 3
Tanggal : 6/22/26 s/d 6/28/26

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Hasil Pelaksanaan Pekerjaan						
		Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot %	Minggu Lalu		Minggu Ini		Tot s/d Minggu Ini		(%)
							Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	1,00	480.000,00	480.000,00	0,30	1,00	0,30	-	-	1,00	0,30	100,00
2	Pek. Papan Proyek	Ls	1,00	90.000,00	90.000,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06	100,00
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,62	1,00	0,62	-	-	1,00	0,62	100,00
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing	Bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00	1,11	2,00	0,56	2,00	0,56	4,00	1,11	100,00
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	1,00	0,25	-	-	1,00	0,25	100,00
B	PEKERJAAN ATAP DAN DINDING												
1	Pek. Pengecatan Dinding Permukaan Lama	M2	1.785,89	34.000,00	60.720.260,00	37,47	510,00	10,70	750,00	15,73	1.260,00	26,43	70,55
2	Pek. Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	167,51	62.000,00	10.385.620,00	6,41	-	-	40,00	1,53	40,00	1,53	23,88
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	M2	26,41	158.000,00	4.172.780,00	2,57	-	-	8,00	0,78	8,00	0,78	30,29
4	Pek. Pasangan Nok Atap	M1	20,76	99.000,00	2.055.240,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm	M2	6,52	168.000,00	1.095.360,00	0,68	-	-	2,00	0,21	2,00	0,21	30,67
6	90% Rangka Eksisting, 10% Rangka Baru (Kayu kelas II)												
6	Pek. Memasang Langit-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	M2	65,16	80.000,00	5.212.800,00	3,22	-	-	26,00	1,28	26,00	1,28	39,90
7	Pek. Pengecatan Plafond	M2	680,54	34.000,00	23.138.360,00	14,28	140,00	2,94	345,00	7,24	485,00	10,17	71,27
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI												
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif	M2	23,88	285.000,00	6.805.800,00	4,20	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished	M2	65,46	379.000,00	24.809.340,00	15,31	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Kloset Jongkok Porselen	Bh	4,00	700.000,00	2.800.000,00	1,73	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3"	M1	18,00	139.000,00	2.502.000,00	1,54	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2"	M1	48,00	38.000,00	1.824.000,00	1,13	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless	Bh	6,00	85.000,00	510.000,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-
D	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN												
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	1,00	230.000,00	230.000,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih	Bh	10,00	165.000,00	1.650.000,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Stop Kontak	Bh	2,00	155.000,00	310.000,00	0,19	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,56	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2	M2	2,60	1.000.000,00	2.600.000,00	1,60	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle)	Bh	4,00	575.000,00	2.300.000,00	1,42	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu	Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pull Handle Pintu	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-
F	PEKERJAAN LAIN LAIN												
1	Pek. Sewa Scaffolding	Ls	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,68	1,00	0,68	-	-	1,00	0,68	100,00
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL FISIK					162.071.560,00	100,00		16,09		27,33		43,41	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN 11 % x A)					17.827.871,60						Rencana		34,33
JUMLAH + PPN					179.899.431,60						Realisasi		43,41
DIBULATKAN					179.899.431,00						Deviasi (+/-)		9,09

Disetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dr. Junaldi, S. Ag., M. Pd., I
NIP. 19700227 199703 1 002

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Trihanda Konsultan

Yudi Setiawan, SH
Direktur

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
CV. Anugrah

Ronal Mardiyaswan
Direktur

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN PEKERJAAN

Unit Kerja : Uin STS Jambi
Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tanggal Kontrak : 6/11/26
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
Nilai Kontrak : Rp 179.899.431,00
Tahun Anggaran : 2026

Minggu : 4
Tanggal : 6/29/26 s/d 7/5/26

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Hasil Pelaksanaan Pekerjaan						
		Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot %	Minggu Lalu		Minggu Ini		Tot s/d Minggu ini		(%)
							Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	1,00	480.000,00	480.000,00	0,30	1,00	0,30	-	-	1,00	0,30	100,00
2	Pek. Papan Proyek	Ls	1,00	90.000,00	90.000,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06	100,00
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,62	1,00	0,62	-	-	1,00	0,62	100,00
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing	Bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00	1,11	4,00	1,11	-	-	4,00	1,11	100,00
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	1,00	0,25	-	-	1,00	0,25	100,00
B	PEKERJAAN ATAP DAN DINDING												
1	Pek. Pengecatan Dinding Permukaan Lama	M2	1.785,89	34.000,00	60.720.260,00	37,47	1.260,00	26,43	465,00	9,75	1.725,00	36,19	96,59
2	Pek. Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	167,51	62.000,00	10.385.620,00	6,41	40,00	1,53	85,00	3,25	125,00	4,78	74,62
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	M2	26,41	158.000,00	4.172.780,00	2,57	8,00	0,78	15,00	1,46	23,00	2,24	87,09
4	Pek. Pasangan Nok Atap	M1	20,76	99.000,00	2.055.240,00	1,27	-	-	11,00	0,67	11,00	0,67	52,99
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm	M2	6,52	168.000,00	1.095.360,00	0,68	2,00	0,21	4,52	0,47	6,52	0,68	100,00
	90% Rangka Eksisting, 10% Rangka Baru (Kayu kelas II)												
6	Pek. Memasang Langit-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	M2	65,16	80.000,00	5.212.800,00	3,22	26,00	1,28	34,00	1,68	60,00	2,96	92,08
7	Pek. Pengecatan Plafond	M2	680,54	34.000,00	23.138.360,00	14,28	485,00	10,17	180,00	3,78	665,00	13,95	97,72
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI												
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif	M2	23,88	285.000,00	6.805.800,00	4,20	-	-	12,00	2,11	12,00	2,11	50,25
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished	M2	65,46	379.000,00	24.809.340,00	15,31	-	-	25,00	5,85	25,00	5,85	38,19
3	Pek. Kloset Jongkok Porselen	Bh	4,00	700.000,00	2.800.000,00	1,73	-	-	2,00	0,86	2,00	0,86	50,00
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3"	M1	18,00	139.000,00	2.502.000,00	1,54	-	-	6,00	0,51	6,00	0,51	33,33
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2"	M1	48,00	38.000,00	1.824.000,00	1,13	-	-	18,00	0,42	18,00	0,42	37,50
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,37	-	-	2,00	0,12	2,00	0,12	33,33
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless	Bh	6,00	85.000,00	510.000,00	0,31	-	-	1,00	0,05	1,00	0,05	16,67
D	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN												
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	1,00	230.000,00	230.000,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih	Bh	10,00	165.000,00	1.650.000,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Stop Kontak	Bh	2,00	155.000,00	310.000,00	0,19	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,56	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00	0,37	-	-	-	-	-	-	-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2	M2	2,60	1.000.000,00	2.600.000,00	1,60	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle)	Bh	4,00	575.000,00	2.300.000,00	1,42	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu	Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pull Handle Pintu	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-
F	PEKERJAAN LAIN LAIN												
1	Pek. Sewa Scaffolding	Ls	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,68	1,00	0,68	-	-	1,00	0,68	100,00
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL FISIK					162.071.560,00	100,00					31,00		74,41
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN 11 % x A)					17.827.871,60								60,39
JUMLAH + PPN					179.899.431,60								74,41
DIBULATKAN					179.899.431,00								14,02

Disetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen
Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dr. Junaidi, S. Ag., M. Pd.
NIP. 19700227 199203 1 002

Diperiksa:
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Trihanda Konsultan

Yudi Setiawan, SH
Direktur

Dibuat:
Kontraktor Pelaksana
CV. Anugrah

Ronal Mardiyaswan
Direktur

JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

Pekerjaan : Renovasi Student Center
 No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
 Tanggal Kontrak : 11/06/2026
 Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Muaro Jambi
 Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT	MASA PELAKSANAAN												KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					BULAN 1						BULAN 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					6/11/26 s/d 6/14/26	6/15/26 s/d 6/21/26	6/22/26 s/d 6/28/26	6/29/26 s/d 7/5/26	7/6/26 s/d 7/12/26	7/13/26 s/d 7/19/26	7/20/26 s/d 7/24/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				1,22	0,56	0,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Disetujui
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 Kabupaten Muaro Jambi

Dr. Junaidi, S. Ag., M. Pd. I
 NIP. 197002271997031002

Diperiksa :
 Konsultan Pengawas
 CV. Cakra Trihanda Konsultan

CV. Cakra Trihanda Konsultan
 Yudi Setiawan, SH
 Direktur

Dibuat :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. Anugrah

CV. ANUGRAH
 CV. ANUGRAH
 CV. ANUGRAH

Ronal Mardyaswan
 Direktur

LAPORAN PROGRESS BULANAN PEKERJAAN

Unit Kerja : Uin STS Jambi
Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tanggal Kontrak : 6/11/26
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
Nilai Kontrak : Rp 179.899.431,00
Tahun Anggaran : 2026

Bulan ke : 2
Tanggal : 7/6/26 s/d 7/24/26

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Hasil Pelaksanaan Pekerjaan							
		Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot %	Bulan Lalu		Bulan Ini		Tot s/d Bulan ini		(%)	
							Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	1,00	480.000,00	480.000,00	0,30	1,00	0,30	-	-	1,00	0,30	100,00	
2	Pek. Papan Proyek	Ls	1,00	90.000,00	90.000,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06	100,00	
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,62	1,00	0,62	-	-	1,00	0,62	100,00	
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing	Bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00	1,11	4,00	1,11	-	-	4,00	1,11	100,00	
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	1,00	0,25	-	-	1,00	0,25	100,00	
B	PEKERJAAN ATAP DAN DINDING													
1	Pek. Pengecatan Dinding Permukaan Lama	M2	1.785,89	34.000,00	60.720.260,00	37,47	1.725,00	36,19	60,89	1,28	1.785,89	37,47	100,00	
2	Pek. Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	167,51	62.000,00	10.385.620,00	6,41	125,00	4,78	42,51	1,63	167,51	6,41	100,00	
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	M2	26,41	158.000,00	4.172.780,00	2,57	23,00	2,24	3,41	0,33	26,41	2,57	100,00	
4	Pek. Pasangan Nok Atap	M1	20,76	99.000,00	2.055.240,00	1,27	11,00	0,67	9,76	0,60	20,76	1,27	100,00	
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm 90% Rangka Eksisting, 10% Rangka Baru (Kayu kelas II)	M2	6,52	168.000,00	1.095.360,00	0,68	6,52	0,68	-	-	6,52	0,68	100,00	
6	Pek. Memasang Langit-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	M2	65,16	80.000,00	5.212.800,00	3,22	60,00	2,96	5,16	0,25	65,16	3,22	100,00	
7	Pek. Pengecatan Plafond	M2	680,54	34.000,00	23.138.360,00	14,28	665,00	13,95	15,54	0,33	680,54	14,28	100,00	
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI													
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif	M2	23,88	285.000,00	6.805.800,00	4,20	12,00	2,11	11,88	2,09	23,88	4,20	100,00	
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished	M2	65,46	379.000,00	24.809.340,00	15,31	25,00	5,85	40,46	9,46	65,46	15,31	100,00	
3	Pek. Kloset Jongkok Porselen	Bh	4,00	700.000,00	2.800.000,00	1,73	2,00	0,86	2,00	0,86	4,00	1,73	100,00	
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3"	M1	18,00	139.000,00	2.502.000,00	1,54	6,00	0,51	12,00	1,03	18,00	1,54	100,00	
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2"	M1	48,00	38.000,00	1.824.000,00	1,13	18,00	0,42	30,00	0,70	48,00	1,13	100,00	
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,37	2,00	0,12	4,00	0,25	6,00	0,37	100,00	
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless	Bh	6,00	85.000,00	510.000,00	0,31	1,00	0,05	5,00	0,26	6,00	0,31	100,00	
D	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN													
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	1,00	230.000,00	230.000,00	0,14	-	-	1,00	0,14	1,00	0,14	100,00	
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih	Bh	10,00	165.000,00	1.650.000,00	1,02	-	-	10,00	1,02	10,00	1,02	100,00	
3	Pek. Pasangan Stop Kontak	Bh	2,00	155.000,00	310.000,00	0,19	-	-	2,00	0,19	2,00	0,19	100,00	
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,56	-	-	6,00	0,56	6,00	0,56	100,00	
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00	0,37	-	-	4,00	0,37	4,00	0,37	100,00	
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2	M2	2,60	1.000.000,00	2.600.000,00	1,60	-	-	2,60	1,60	2,60	1,60	100,00	
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle)	Bh	4,00	575.000,00	2.300.000,00	1,42	-	-	4,00	1,42	4,00	1,42	100,00	
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu	Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,30	-	-	6,00	0,30	6,00	0,30	100,00	
4	Pek. Pull Handle Pintu	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	2,00	0,68	2,00	0,68	100,00	
F	PEKERJAAN LAIN LAIN													
1	Pek. Sewa Scaffolding	Ls	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,68	1,00	0,68	-	-	1,00	0,68	100,00	
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	1,00	0,25	1,00	0,25	100,00	
JUMLAH TOTAL FISIK					162.071.560,00	100,00		74,41		25,59		100,00		
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn 11 % x A)					17.827.871,60						Rencana		100,00	
JUMLAH + PPN					179.899.431,60						Realisasi		100,00	
DIBULATKAN					179.899.431,00						Deviasi (+/-)		-	

Disetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dr. Junaidi, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 19700227 199703 1 002

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Trihanda Konsultan

CV. CAKRA TRIHANDA KONSULTAN
Yudi Setiawan, SH
Direktur

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
CV. Anugrah

CV. ANUGRAH
Ronal Mardiyaswan
Direktur

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN PEKERJAAN

Unit Kerja : Uin STS Jambi
Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KJ.01.2/06/2026
Tanggal Kontrak : 6/11/26
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
Nilai Kontrak : Rp 179.899.431,00
Tahun Anggaran : 2026

Minggu : 5
Tanggal : 7/6/26 s/d 7/12/26

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Hasil Pelaksanaan Pekerjaan						
		Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot %	Minggu Lalu		Minggu Ini		Tot s/d Minggu Ini		(%)
							Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	1,00	480.000,00	480.000,00	0,30	1,00	0,30	-	-	1,00	0,30	100,00
2	Pek. Papan Proyek	Ls	1,00	90.000,00	90.000,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06	100,00
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,62	1,00	0,62	-	-	1,00	0,62	100,00
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing	Bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00	1,11	4,00	1,11	-	-	4,00	1,11	100,00
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	1,00	0,25	-	-	1,00	0,25	100,00
B PEKERJAAN ATAP DAN DINDING													
1	Pek. Pengcatan Dinding Permukaan Lama	M2	1.785,89	34.000,00	60.720.260,00	37,47	1.725,00	36,19	13,00	0,27	1.738,00	36,46	97,32
2	Pek. Pengcatan Bidang Kayu Lama	M2	167,51	62.000,00	10.385.620,00	6,41	125,00	4,78	30,00	1,15	155,00	5,93	92,53
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	M2	26,41	158.000,00	4.172.780,00	2,57	23,00	2,24	2,00	0,19	25,00	2,44	94,66
4	Pek. Pasangan Nok Atap	M1	20,76	99.000,00	2.055.240,00	1,27	11,00	0,67	9,76	0,60	20,76	1,27	100,00
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm	M2	6,52	168.000,00	1.095.360,00	0,68	6,52	0,68	-	-	6,52	0,68	100,00
	90% Rangka Eksisting, 10% Rangka Baru (Kayu kelas II)												
6	Pek. Memasang Langit-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	M2	65,16	80.000,00	5.212.800,00	3,22	60,00	2,96	3,00	0,15	63,00	3,11	96,69
7	Pek. Pengcatan Plafond	M2	680,54	34.000,00	23.138.360,00	14,28	665,00	13,95	-	-	665,00	13,95	97,72
C PEKERJAAN KAMAR MANDI													
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif	M2	23,88	285.000,00	6.805.800,00	4,20	12,00	2,11	10,00	1,76	22,00	3,87	92,13
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished	M2	65,46	379.000,00	24.809.340,00	15,31	25,00	5,85	31,00	7,25	56,00	13,10	85,55
3	Pek. Kloset Jongkok Porselen	Bh	4,00	700.000,00	2.800.000,00	1,73	2,00	0,86	1,00	0,43	3,00	1,30	75,00
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3"	M1	18,00	139.000,00	2.502.000,00	1,54	6,00	0,51	12,00	1,03	18,00	1,54	100,00
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2"	M1	48,00	38.000,00	1.824.000,00	1,13	18,00	0,42	30,00	0,70	48,00	1,13	100,00
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,37	2,00	0,12	4,00	0,25	6,00	0,37	100,00
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless	Bh	6,00	85.000,00	510.000,00	0,31	1,00	0,05	5,00	0,26	6,00	0,31	100,00
D PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN													
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	1,00	230.000,00	230.000,00	0,14	-	-	1,00	0,14	1,00	0,14	100,00
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih	Bh	10,00	165.000,00	1.650.000,00	1,02	-	-	10,00	1,02	10,00	1,02	100,00
3	Pek. Pasangan Stop Kontak	Bh	2,00	155.000,00	310.000,00	0,19	-	-	2,00	0,19	2,00	0,19	100,00
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,56	-	-	6,00	0,56	6,00	0,56	100,00
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00	0,37	-	-	4,00	0,37	4,00	0,37	100,00
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2	M2	2,60	1.000.000,00	2.600.000,00	1,60	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle)	Bh	4,00	575.000,00	2.300.000,00	1,42	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu	Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pull Handle Pintu	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-
F PEKERJAAN LAIN LAIN													
1	Pek. Sewa Scaffolding	Ls	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,68	1,00	0,68	-	-	1,00	0,68	100,00
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL FISIK					162.071.560,00	100,00		74,41		16,32		90,73	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN 11 % x A)					17.827.871,60								85,17
JUMLAH + PPN					179.899.431,60								90,73
DIBULATKAN					179.899.431,00								5,55

Disetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Dr. Junaldi, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 19700227 199703 1 002

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Trihanda Konsultan

CV. CAKRA TRIHANDA KONSULTAN
Yudi Setiawan, SH
Direktur

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
CV. Anugrah

CV. ANUGRAH
Ronal Mardiyaswan
Direktur

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN PEKERJAAN

Unit Kerja : Uin STS Jambi
Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tanggal Kontrak : 6/11/26
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
Nilai Kontrak : Rp 179.899.431,00
Tahun Anggaran : 2026

Minggu : 6
Tanggal : 7/13/26 s/d 7/19/26

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Hasil Pelaksanaan Pekerjaan						
		Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot %	Minggu Lalu		Minggu Ini		Tot s/d Minggu Ini		(%)
							Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	1,00	480.000,00	480.000,00	0,30	1,00	0,30	-	-	1,00	0,30	100,00
2	Pek. Papan Proyek	Ls	1,00	90.000,00	90.000,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06	100,00
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,62	1,00	0,62	-	-	1,00	0,62	100,00
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing	Bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00	1,11	4,00	1,11	-	-	4,00	1,11	100,00
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	1,00	0,25	-	-	1,00	0,25	100,00
B	PEKERJAAN ATAP DAN DINDING												
1	Pek. Pengecatan Dinding Permukaan Lama	M2	1.785,89	34.000,00	60.720.260,00	37,47	1.738,00	36,46	47,89	1,00	1.785,89	37,47	100,00
2	Pek. Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	167,51	62.000,00	10.385.620,00	6,41	155,00	5,93	12,51	0,48	167,51	6,41	100,00
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	M2	26,41	158.000,00	4.172.780,00	2,57	25,00	2,44	1,41	0,14	26,41	2,57	100,00
4	Pek. Pasangan Nok Atap	M1	20,76	99.000,00	2.055.240,00	1,27	20,76	1,27	-	-	20,76	1,27	100,00
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm	M2	6,52	168.000,00	1.095.360,00	0,68	6,52	0,68	-	-	6,52	0,68	100,00
	90% Rangka Eksisting, 10% Rangka Baru (Kayu kelas II)												
6	Pek. Memasang Langit-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	M2	65,16	80.000,00	5.212.800,00	3,22	63,00	3,11	2,16	0,11	65,16	3,22	100,00
7	Pek. Pemasangan Plafond	M2	680,54	34.000,00	23.138.360,00	14,28	665,00	13,95	15,54	0,33	680,54	14,28	100,00
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI												
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif	M2	23,88	285.000,00	6.805.800,00	4,20	22,00	3,87	1,88	0,33	23,88	4,20	100,00
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished	M2	65,46	379.000,00	24.809.340,00	15,31	56,00	13,10	9,46	2,21	65,46	15,31	100,00
3	Pek. Kloset Jongkok Porselen	Bh	4,00	700.000,00	2.800.000,00	1,73	3,00	1,30	1,00	0,43	4,00	1,73	100,00
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3"	M1	18,00	139.000,00	2.502.000,00	1,54	18,00	1,54	-	-	18,00	1,54	100,00
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2"	M1	48,00	38.000,00	1.824.000,00	1,13	48,00	1,13	-	-	48,00	1,13	100,00
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,37	6,00	0,37	-	-	6,00	0,37	100,00
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless	Bh	6,00	85.000,00	510.000,00	0,31	6,00	0,31	-	-	6,00	0,31	100,00
D	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN												
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	1,00	230.000,00	230.000,00	0,14	1,00	0,14	-	-	1,00	0,14	100,00
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih	Bh	10,00	165.000,00	1.650.000,00	1,02	10,00	1,02	-	-	10,00	1,02	100,00
3	Pek. Pasangan Stop Kontak	Bh	2,00	155.000,00	310.000,00	0,19	2,00	0,19	-	-	2,00	0,19	100,00
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,56	6,00	0,56	-	-	6,00	0,56	100,00
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00	0,37	4,00	0,37	-	-	4,00	0,37	100,00
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2	M2	2,60	1.000.000,00	2.600.000,00	1,60	-	-	2,60	1,60	2,60	1,60	100,00
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle)	Bh	4,00	575.000,00	2.300.000,00	1,42	-	-	4,00	1,42	4,00	1,42	100,00
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu	Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,30	-	-	6,00	0,30	6,00	0,30	100,00
4	Pek. Pull Handle Pintu	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	0,68	-	-	2,00	0,68	2,00	0,68	100,00
F	PEKERJAAN LAIN LAIN												
1	Pek. Sewa Scaffolding	Ls	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,68	1,00	0,68	-	-	1,00	0,68	100,00
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL FISIK					162.071.560,00	100,00					9,03		99,75
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN 11 % x A)					17.827.871,60								98,78
JUMLAH + PPN					179.899.431,60								99,75
DIBULATKAN					179.899.431,00								Deviasi (+/-) 0,97

Disetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Ulin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dr. Junaldi, S. Ag., M. Pd.
NIP. 19700227 199703 1 002

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Trihanda Konsultan

Yudi Setiawan, SH
Direktur

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
CV. Anugrah

Ronal Mardiyaswan
Direktur

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN PEKERJAAN

Unit Kerja : Uin STS Jambi
Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tanggal Kontrak : 6/11/26
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
Nilai Kontrak : Rp 179.899.431,00
Tahun Anggaran : 2026

Minggu : 7
Tanggal : 7/20/26 s/d 7/23/26

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal					Hasil Pelaksanaan Pekerjaan						
		Satuan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot %	Minggu Lalu		Minggu Ini		Tot s/d Minggu ini		(%)
							Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	Vol	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	1,00	480.000,00	480.000,00	0,30	1,00	0,30	-	-	1,00	0,30	100,00
2	Pek. Papan Proyek	Ls	1,00	90.000,00	90.000,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06	100,00
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,62	1,00	0,62	-	-	1,00	0,62	100,00
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing	Bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00	1,11	4,00	1,11	-	-	4,00	1,11	100,00
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	1,00	0,25	-	-	1,00	0,25	100,00
B	PEKERJAAN ATAP DAN DINDING												
1	Pek. Pengecatan Dinding Permukaan Lama	M2	1.785,89	34.000,00	60.720.260,00	37,47	1.785,89	37,47	-	-	1.785,89	37,47	100,00
2	Pek. Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	167,51	62.000,00	10.385.620,00	6,41	167,51	6,41	-	-	167,51	6,41	100,00
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	M2	26,41	158.000,00	4.172.780,00	2,57	26,41	2,57	-	-	26,41	2,57	100,00
4	Pek. Pasangan Nok Atap	M1	20,76	99.000,00	2.055.240,00	1,27	20,76	1,27	-	-	20,76	1,27	100,00
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm	M2	6,52	168.000,00	1.095.360,00	0,68	6,52	0,68	-	-	6,52	0,68	100,00
6	90% Rangka Eksisting, 10% Rangka Baru (Kayu kelas II)												
6	Pek. Memasang Langit-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	M2	65,16	80.000,00	5.212.800,00	3,22	65,16	3,22	-	-	65,16	3,22	100,00
7	Pek. Pengecatan Plafond	M2	680,54	34.000,00	23.138.360,00	14,28	680,54	14,28	-	-	680,54	14,28	100,00
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI												
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif	M2	23,88	285.000,00	6.805.800,00	4,20	23,88	4,20	-	-	23,88	4,20	100,00
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished	M2	65,46	379.000,00	24.809.340,00	15,31	65,46	15,31	-	-	65,46	15,31	100,00
3	Pek. Kloset Jongkok Porselen	Bh	4,00	700.000,00	2.800.000,00	1,73	4,00	1,73	-	-	4,00	1,73	100,00
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3"	M1	18,00	139.000,00	2.502.000,00	1,54	18,00	1,54	-	-	18,00	1,54	100,00
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2"	M1	48,00	38.000,00	1.824.000,00	1,13	48,00	1,13	-	-	48,00	1,13	100,00
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless	Bh	6,00	100.000,00	600.000,00	0,37	6,00	0,37	-	-	6,00	0,37	100,00
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless	Bh	6,00	85.000,00	510.000,00	0,31	6,00	0,31	-	-	6,00	0,31	100,00
D	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN												
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	1,00	230.000,00	230.000,00	0,14	1,00	0,14	-	-	1,00	0,14	100,00
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih	Bh	10,00	165.000,00	1.650.000,00	1,02	10,00	1,02	-	-	10,00	1,02	100,00
3	Pek. Pasangan Stop Kontak	Bh	2,00	155.000,00	310.000,00	0,19	2,00	0,19	-	-	2,00	0,19	100,00
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,56	6,00	0,56	-	-	6,00	0,56	100,00
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00	0,37	4,00	0,37	-	-	4,00	0,37	100,00
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2	M2	2,60	1.000.000,00	2.600.000,00	1,60	2,60	1,60	-	-	2,60	1,60	100,00
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle)	Bh	4,00	575.000,00	2.300.000,00	1,42	4,00	1,42	-	-	4,00	1,42	100,00
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu	Bh	6,00	80.000,00	480.000,00	0,30	6,00	0,30	-	-	6,00	0,30	100,00
4	Pek. Pull Handle Pintu	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	0,68	2,00	0,68	-	-	2,00	0,68	100,00
F	PEKERJAAN LAIN LAIN												
1	Pek. Sewa Scaffolding	Ls	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,68	1,00	0,68	-	-	1,00	0,68	100,00
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,25	-	-	1,00	0,25	1,00	0,25	100,00
JUMLAH TOTAL FISIK					162.071.560,00	100,00		99,75		0,25		100,00	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn 11 % x A)					17.827.871,60								100,00
JUMLAH + PPN					179.899.431,60								100,00
DIBULATKAN					179.899.431,00								0,00

Disetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen
Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Dr. Junaldi, S. Ag., M. Pd.,
NIP. 19700227 199703 1 002

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Trihanda Konsultan



Yudi Setiawan, SH
Direktur

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
CV. Anugrah



Ronal Mardiyaswan
Direktur

JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

Pekerjaan : Renovasi Student Center
 No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
 Tanggal Kontrak : 11/06/2026
 Waktu Pelaksanaan : 45 Hari (Kalender)
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Muaro Jambi
 Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT	MASA PELAKSANAAN												KET		
					BULAN 1						BULAN 2								
					6/11/26 s/d 6/14/26	6/15/26 s/d 6/21/26	6/22/26 s/d 6/28/26	6/29/26 s/d 7/5/26	7/6/26 s/d 7/12/26	7/13/26 s/d 7/19/26	7/20/26 s/d 7/24/26								
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				1,22	0,56	0,56												
B	PEKERJAAN ATAP DAN DINDING					9,37	14,88	18,30	17,63	5,71									
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI						7,08	7,76	4,88	4,88									
D	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN								2,28										
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									3,02	0,97								
F	PEKERJAAN LAIN LAIN					0,68					0,25								
					JUMLAH												100,00		
RENCANA	FISIK PER MINGGU				1,89	9,92	22,51	26,06	24,78	13,61	1,22								
	KOMULATIF			-	1,89	11,82	34,33	60,39	85,17	98,78	100,00								
REALISASI	FISIK PER MINGGU			-	1,22	14,87	27,33	31,00	16,32	9,03	0,25								
	KOMULATIF			-	1,22	16,09	43,41	74,41	90,73	99,75	100,00								
DEVIASI	FISIK PER MINGGU				(0,68)	4,27	9,09	14,02	5,55	0,97	-								

Disetujui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 Un Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 Kabupaten Muaro Jambi



Diperiksa :
Konsultan Pengawas
 CV. Cakra Trihanda Konsultan



Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
 CV. Anugrah



Ronal Mardiyaswan
 Direktur

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	: Renovasi Student Center
No. Kontrak	: B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	: 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	: CV. Anugrah

TANGGAL : 11-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
B	KONSULTAN PENGAWAS		
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	: Renovasi Student Center
No. Kontrak	: B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	: 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	: CV. Anugrah

TANGGAL : 12-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
B	KONSULTAN PENGAWAS		
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

[illegible]

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak : 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi : CV. Anugrah

TANGGAL : 13-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
B	KONSULTAN PENGAWAS		
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, S

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	: Renovasi Student Center
No. Kontrak	: B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	: 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	: CV. Anugrah

TANGGAL : 14-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
B	KONSULTAN PENGAWAS		
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, S

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak : 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi : CV. Anugrah

TANGGAL : 15-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	SCAFOLDING	20 SET	TOKO	STD CENTER
2	CAT	3 PILE	TOKO	STD CENTER
3	KUAS ROL	3 BH	TOKO	STD CENTER
4	BAK CAT	3 BH	TOKO	STD CENTER
5	KUAS CAT	3 BH	TOKO	STD CENTER
6	SAPU	2 BH	TOKO	STD CENTER

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1 Org	Proyek
2	Inspector	1 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1 Org	Proyek
2	Mandor	1 Org	Proyek
3	Tukang	4 Org	Proyek
4	Pekerja	2 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M. ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	: Renovasi Student Center
No. Kontrak	: B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	: 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	: CV. Anugrah

TANGGAL : 16-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	: Renovasi Student Center
No. Kontrak	: B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	: 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	: CV. Anugrah

TANGGAL : 17-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1 Org	Proyek
2	Inspector	1 Org	Proyek
C	PERYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1 Org	Proyek
2	Mandor	1 Org	Proyek
3	Tukang	4 Org	Proyek
4	Pekerja	2 Org	Proyek

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	: Renovasi Student Center
No. Kontrak	: B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	: 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	: CV. Anugrah

TANGGAL : 18-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1 Org	Proyek
2	Inspector	1 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1 Org	Proyek
2	Mandor	1 Org	Proyek
3	Tukang	4 Org	Proyek
4	Pekerja	2 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KJ.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak : 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi : CV. Anugrah

TANGGAL : 19-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkui	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1 Org	Proyek
2	Inspector	1 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1 Org	Proyek
2	Mandor	1 Org	Proyek
3	Tukang	4 Org	Proyek
4	Pekerja	2 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan : Renovasi Student Center
No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak : 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi : CV. Anugrah

TANGGAL : 20-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1 Org	Proyek
2	Inspector	1 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1 Org	Proyek
2	Mandor	1 Org	Proyek
3	Tukang	4 Org	Proyek
4	Pekerja	2 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	: Renovasi Student Center
No. Kontrak	: B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	: 11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	: CV. Anugrah

TANGGAL : 21-Juni-26

A. PEKERJAAN

NO	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
		LIBUR		

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKALAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkui	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
B	KONSULTAN PENGAWAS		
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	Gerimis		Proyek
3	Banjir		Proyek
4	Air Pasang		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M. ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.D1.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 22-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1 Org	Proyek
2	Inspector	1 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Petaksane Lapangan	1 Org	Proyek
2	Mandor	1 Org	Proyek
3	Tukang	4 Org	Proyek
4	Pekerja	2 Org	Proyek

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkui	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengko	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HULIAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANDIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B 2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 23-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Ptengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	Gerimis		Proyek
3	Banjir		Proyek
4	Air Pasang		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan
No. Kontrak
Tgl. Kontrak
Penyedia Jasa Konstruksi

Renovasi Student Center
B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
11-Jun-26
CV. Anugrah

TANGGAL : 24-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI: PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Ptengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alet Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERUMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 25-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH /AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkui	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Plengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M. ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 26-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH /AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, S

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 27-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 28-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH /AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengk	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
B	KONSULTAN PENGAWAS		
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAN	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANDIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M. ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 29-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	GRANIT DINDING 60X60	46 KTK	TOKO	STD CENTER
2	KERAMIK LANTAI 60X60	18 KTK	TOKO	STD CENTER
3	CAT TEMBOK	3 PILE	TOKO	STD CENTER
4	KLOSET JONGKOK	4 BH	TOKO	STD CENTER
5	PIPA PVC 1/2 INCH	13 BTG	TOKO	STD CENTER
6	PIPA PVC 3 INCH	3 BTG	TOKO	STD CENTER
7	KRAN AIR	6 BH	TOKO	STD CENTER
8	FLOOR DRAIN	6 BH	TOKO	STD CENTER

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1 Org	Proyek
2	Inspector	1 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1 Org	Proyek
2	Mandor	1 Org	Proyek
3	Tukang	4 Org	Proyek
4	Pekerja	2 Org	Proyek

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Froyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 30-Jun-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH /AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkui	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	Gerimis		Proyek
3	Banjir		Proyek
4	Air Pasang		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 01-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH /AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 02-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan : Renovasi Student Center
 No. Kontrak : B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
 Tgl. Kontrak : 11-Jun-26
 Penyedia Jasa Konstruksi : CV. Anugrah

TANGGAL : 03-Jul-26

A. PEKERJAAN

NO	KODE	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI
1		CAT KAYU	40,00 M2	
2		CAT PLAFOND	20,00 M2	
3		DINDING GRANIT	5,00 M2	
4		LANTAI KERAMIK	5,00 M2	
5		KLOSET JONGKOK	1,00 BH	
6		KRAN AIR	1,00 BH	
7		FLOOR DRAIN	1,00 BH	
8		PEK GENTENG METAL	15,00 M2	
9		PEK. NOK ATAP	11,00 M1	

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

NO	JENIS	CACAH / VOLUME	LOKASI ASAL	LOKASI TUJUAN
1	CAT TEMBOK	3 PILE	TOKO	STD CENTER
2	KUAS ROL	3 BH	TOKO	STD CENTER
3	CAT KAYU	10 BH	TOKO	STD CENTER
4	TJNER	5 BTL	TOKO	STD CENTER
5	KUAS	3 BH	TOKO	STD CENTER

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A DIREKSI PEKERJAAN UMUM			
1	Koordinator Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B KONSULTAN PENGAWAS			
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C PENYEDIA JASA KONSTRUKSI			
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 04-Jul-26

A. PEKERJAAN

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible][illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BAWJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, S

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 05-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH /AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERJAMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, S

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 06-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKAZAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1 Org	Proyek
2	Inspector	1 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1 Org	Proyek
2	Mandor	1 Org	Proyek
3	Tukang	4 Org	Proyek
4	Pekerja	2 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 07-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 08-Jui-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKLAMAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkui	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	Gerimis		Proyek
3	Banjir		Proyek
4	Air Pasang		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 09-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M. ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01 2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 10-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIGA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1.	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4.	ATR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KJ.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-25
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 11-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

8. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervis/ Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	ATR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan
No. Kontrak
Tgl. Kontrak
Penyedia Jasa Konstruksi

Renovasi Student Center
B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
11-Jun-26
CV. Anugrah

TANGGAL : 12-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

C. PEMAKAIAN PERALATAN							
NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				


D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR			
NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. GUGA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PER			
NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN		TANDA TANGAN & NAMA JELAS
DARI PIHAK	URAIAN	
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 13-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1 Org	Proyek
2	Inspector	1 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1 Org	Proyek
2	Mandor	1 Org	Proyek
3	Tukang	4 Org	Proyek
4	Pekerja	2 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	Gerimis		Proyek
3	Banjir		Proyek
4	Air Pasang		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

F. USUL / PENGHAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / RESEPARATAN / PERSYARATAN		
DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 14-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URATAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HELMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 15-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek


C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B 2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 16-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PERNYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PKK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 17-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAN /AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cengkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Plengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	SANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HELMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 18-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 19-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	Gerimis		Proyek
3	Banjir		Proyek
4	Air Pasang		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M. ANUGRAH ARRUHAM, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 20-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengku	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	EXCAVATOR	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH		LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM			
1	Koordinator Pengawas lapangan	1	Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1	Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS			
1	Supervisi Engineer	1	Org	Proyek
2	Inspector	1	Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI			
1	Pelaksana Lapangan	1	Org	Proyek
2	Mandor	1	Org	Proyek
3	Tukang	4	Org	Proyek
4	Pekerja	2	Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	Gerimis		Proyek
3	Banjir		Proyek
4	Air Pasang		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un 15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 21-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	EXCAVATOR	1 Buah	Proyek				


D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JEMIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 22-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PENAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAM / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Pengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	EXCAVATOR	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Peleksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M. ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 23-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekarya	2,00 Org	Proyek

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Lainnya	1 Buah	Proyek				

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	HUJAN		Proyek
2	GERIMIS		Proyek
3	BANJIR		Proyek
4	AIR PASANG		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M ANUGRAH ARRIHAN, ST

LAPORAN HARIAN STANDART

Pekerjaan	Renovasi Student Center
No. Kontrak	B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
Tgl. Kontrak	11-Jun-26
Penyedia Jasa Konstruksi	CV. Anugrah

TANGGAL : 24-Jul-26

A. PEKERJAAN

[illegible]

B. TIBA / MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

[illegible]

C. PEMAKAIAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	CACAH / AKTIF	LOKASI	NO	JENIS PERALATAN	IDLE	RUSAK
1	Meteran Panjang	1 Set	Proyek				
2	Meteran Pendek	1 Set	Proyek				
3	Parang	1 Buah	Proyek				
4	Cangkul	2 Buah	Proyek				
5	Sekop	2 Buah	Proyek				
6	Piengki	2 Buah	Proyek				
7	Lori	1 Buah	Proyek				
8	Lainnya	1 Buah	Proyek				
9	Alat Bantu Lain	1 Buah	Proyek				

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, KONTRAKTOR

NO	TUGAS / JABATAN	CACAH	LOKASI
A	DIREKSI PEKERJAAN UMUM		
1	Koordinator Pengawas lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Pengawas Lapangan	1,00 Org	Proyek
B	KONSULTAN PENGAWAS		
1	Supervisi Engineer	1,00 Org	Proyek
2	Inspector	1,00 Org	Proyek
C	PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		
1	Pelaksana Lapangan	1,00 Org	Proyek
2	Mandor	1,00 Org	Proyek
3	Tukang	4,00 Org	Proyek
4	Pekerja	2,00 Org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEK

NO	JENIS	JAM	LOKASI
1	Hujan		Proyek
2	Gerimis		Proyek
3	Banjir		Proyek
4	Air Pasang		Proyek

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

DARI PIHAK	URAIAN	TANDA TANGAN & NAMA JELAS
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI		 HILMI FAUZIANSYAH
KONSULTAN		 M. ANUGRAH ARRIHAN, ST



KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi - Ma. Bulian Km 16 Simp. Sei Duren Kab. Muaro Jambi Telp (0741) 583183-584118

FINAL QUANTITY

Pekerjaan :

Renovasi Student Center

Kontrak

B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026

Lokasi :

Kabupaten Muaro Jambi

Tahun Anggaran :

2026

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI



CV. ANUGRAH

Jasa Pelaksana Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha : BG002, BG006, BS001, BS004
Jl. Padang Lamo Kelurahan Pulau Temiang RT. 02 RW. 01 Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo Provinsi Jambi
Email : cvanugrah161618@gmail.com
No. Rek BANK BPD : 3003095998

FINAL QUANTITY (BACK UP DATA)

Unit Kerja
Pekerjaan
No. Kontrak
Tanggal Kontrak
Waktu Pelaksan.
Nilai Kontrak
Tahun Anggaran
Penyedia Jasa

Uin STS Jambi
Renovasi Student Center
B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026
11 Juni 2026
45 Hari (Kalender)
Rp179.899.431
2026
CV. Anugrah

KETERANGAN		UKURAN			JUMLAH	VOL	SAT
A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat MOBILISASI	PANJANG	=	-	1,00	1,00	LS
		LEBAR	=	-			
		TINGGI	=	-			
2	Pek. Papan Proyek K3	PANJANG	=		1,00	1,00	
		LEBAR	=				
		TINGGI	=				
3	Pek. Perlengkapan Safety dan K3 K3	PANJANG	=		1,00	1,00	
		LEBAR	=				
		TINGGI	=				
4	Pek. Pembongkaran Kamar Mandi Existing BONGKAR KAMAR MANDI	PANJANG	=		4,00	4,00	
		LEBAR	=				
		TINGGI	=				
5	Pek. Pembersihan Awal Lokasi PEMBERSIHAN AKHIR	PANJANG	=		1,00	1,00	
		LEBAR	=				
		TINGGI	=				
B. PEKERJAAN ATAP DAN DINDING							
1	Pek. Pengecatan Dinding Permukaan Lama FC DALAM	PANJANG	=	13,52	1,00	43,67	M2
		TINGGI	=	3,23			
	RUANG DALAM	PANJANG	=	13,52	1,00	43,67	M2
		TINGGI	=	3,23			
	FC LUAR	PANJANG	=	11,00	1,00	38,50	M2
		TINGGI	=	3,50			
	RUANG LUAR	PANJANG	=	8,00	1,00	28,00	M2
		TINGGI	=	3,50			
	RUANG AULA DALAM	PANJANG	=	30,69	1,00	98,21	M2
		TINGGI	=	3,20			
	RUANG AULA LUAR	PANJANG	=	14,00	1,00	56,00	M2
		TINGGI	=	4,00			
	WC DALAM	PANJANG	=	8,39	1,00	26,85	M2
		TINGGI	=	3,20			
	WC DALAM	PANJANG	=	7,00	1,00	22,40	M2
		TINGGI	=	3,20			
	WC LUAR	PANJANG	=	4,00	1,00	16,00	M2
		TINGGI	=	4,00			
	RUANG TENGAH	PANJANG	=	54,80	1,00	175,36	M2
		TINGGI	=	3,20			
	TERAS BELAKANG LUAR	PANJANG	=	6,00	1,00	19,20	M2
		TINGGI	=	3,20			
	WC DALAM	PANJANG	=	8,39	1,00	13,42	M2
		TINGGI	=	1,60			

WC DALAM	PANJANG TINGGI	= =	7,00 1,60	1,00	11,20	M2
WC LUAR	PANJANG TINGGI	= =	4,00 4,00	1,00	16,00	M2
KAMAR KANAN DALAM	PANJANG TINGGI	= =	15,69 3,20	1,00	50,21	M2
KAMAR KANAN DALAM	PANJANG TINGGI	= =	13,52 3,20	1,00	43,26	M2
KAMAR KANAN LUAR	PANJANG TINGGI	= =	14,00 4,00	1,00	56,00	M2
FC KANAN DALAM	PANJANG TINGGI	= =	13,52 3,20	1,00	43,26	M2
RUANG DALAM	PANJANG TINGGI	= =	13,52 3,20	1,00	43,26	M2
FC KANAN LUAR	PANJANG TINGGI	= =	11,00 3,50	1,00	38,50	M2
RUANG LUAR	PANJANG TINGGI	= =	8,00 3,50	1,00	28,00	M2
BAGIAN LUAR DEPAN	PANJANG TINGGI	= =	20,40 4,00	1,00	81,60	M2
TIANG TERAS DEPAN X 2 LUAR DALAM	PANJANG TINGGI	= =	11,00 2,70	2,00	59,40	M2
TIANG TERAS BLKG X 2 LUAR DALAM	PANJANG TINGGI	= =	11,00 1,70	2,00	37,40	M2
TIANG TERAS SAMPING KANAN DAN KIRI X 2 LUAR DALAM	PANJANG TINGGI	= =	17,00 2,00	4,00	136,00	M2
LANTAI 1					1.225,38	
KAMAR KIRI DALAM X 4 RUANG	PANJANG TINGGI	= =	11,80 3,20	4,00	151,04	M2
KAMAR KIRI DALAM	PANJANG TINGGI	= =	14,00 3,20	1,00	44,80	M2
KAMAR KIRI LUAR TAMBAH RELIEF BETON	PANJANG TINGGI	= =	24,00 4,10	1,00	98,40	M2
AULA DALAM	PANJANG TINGGI	= =	13,50 3,35	1,00	45,23	M2
AULA DALAM	PANJANG TINGGI	= =	28,50 5,40	1,00	143,10	M2
AULA DALAM	PANJANG TINGGI	= =	19,80 3,35	1,00	66,33	M2
WC DALAM	PANJANG TINGGI	= =	7,70 1,60	1,00	12,32	M2
WC DALAM	PANJANG TINGGI	= =	5,50 1,60	1,00	8,80	M2
WC DALAM	PANJANG TINGGI	= =	7,70 1,60	1,00	12,32	M2
DAPUR ATAS	PANJANG TINGGI	= =	15,52 3,20	1,00	49,66	M2
RAPAT KANAN DALAM	PANJANG TINGGI	= =	19,69 3,20	1,00	63,01	M2
KAMAR DALAM	PANJANG TINGGI	= =	13,52 3,20	1,00	43,26	M2
KAMAR DALAM	PANJANG TINGGI	= =	9,52 3,20	1,00	30,46	M2
TERAS BLKG LUAR	PANJANG TINGGI	= =	5,00 3,20	1,00	16,00	M2
KAMAR KANAN LUAR TAMBAH RELIEF BETON	PANJANG TINGGI	= =	24,00 4,10	1,00	98,40	M2
BAGIAN LUAR DEPAN	PANJANG TINGGI	= =	20,40 4,00	1,00	81,60	M2
TERAS DEPAN LUAR	PANJANG TINGGI	= =	6,00 3,65	1,00	21,90	M2
LANTAI 2					936,64	

FOLDING GATE	PANJANG TINGGI	= =	2,88 2,26	2,00	13,02	M2
PINTU P1	PANJANG TINGGI	= =	0,92 2,50	14,00	32,20	M2
PINTU P2	PANJANG TINGGI	= =	1,52 2,50	4,00	15,20	M2
PINTU P3	PANJANG TINGGI	= =	0,80 2,00	8,00	12,80	M2
PINTU PJ2	PANJANG TINGGI	= =	3,00 2,50	4,00	30,00	M2
J1	PANJANG TINGGI	= =	1,00 2,77	4,00	11,08	M2
J2	PANJANG TINGGI	= =	1,55 1,75	8,00	16,28	M2
J3	PANJANG TINGGI	= =	2,35 1,75	16,00	65,80	M2
V1	PANJANG TINGGI	= =	0,80 0,50	8,00	3,20	M2
SIKU TERAS SAMPING KANAN KIRI	PANJANG TINGGI	= =	0,80 0,55	32,00	14,08	M2
SIKU TERAS DEPAN	PANJANG TINGGI	= =	1,83 1,62	6,00	17,79	M2
SIKU TERAS BELAKANG	PANJANG TINGGI	= =	1,80 0,68	8,00	7,34	M2
ROSTER	PANJANG TINGGI	= =	2,15 4,15	4,00	35,69	M2
LUBANG LANTAI 1 (-)					274,47	
PINTU P1	PANJANG TINGGI	= =	0,92 2,50	18,00	41,40	M2
PINTU P3	PANJANG TINGGI	= =	0,80 2,00	4,00	6,40	M2
J1	PANJANG TINGGI	= =	1,00 2,77	4,00	11,08	M2
J2	PANJANG TINGGI	= =	1,55 1,75	14,00	37,98	M2
V1	PANJANG TINGGI	= =	0,80 0,50	4,00	1,60	M2
JM1	PANJANG TINGGI	= =	2,60 3,15	2,00	16,38	M2
JM2	PANJANG TINGGI	= =	2,60 2,45	2,00	12,74	M2
ROSTER	PANJANG TINGGI	= =	2,15 2,80	4,00	24,08	M2
LUBANG LANTAI 2 (-)					151,66	
VOLUME LUAS					2.212,01	M2
VOLUME LUBANG					426,13	M2
VOLUME BERSIH					1.785,89	
Jumlah Volume					1785,89	M2

2	Pek. Pengecatan Bidang Kayu Lama	PANJANG	=	1,95	32,00	49,92	M2
	P1 DAUN PINTU	LEBAR	=	0,80			
	P1 KUSEN	PANJANG	=	6,60	16,00	15,84	M2
		TINGGI	=	0,15			
	P2 DAUN PINTU	PANJANG	=	1,95	20,00	25,35	M2
		LEBAR	=	0,65			
	P2 KUSEN	PANJANG	=	16,80	5,00	12,60	M2
		TINGGI	=	0,15			
	J1 KUSEN JENDELA	PANJANG	=	8,18	4,00	4,91	M2
		TINGGI	=	0,15			
	J2 DAUN JENDELA	PANJANG	=	3,38	20,00	8,11	M2
		TINGGI	=	0,12			
	J2 KUSEN	PANJANG	=	9,45	10,00	14,18	M2
		TINGGI	=	0,15			
J3 DAUN JENDELA	PANJANG	=	3,38	24,00	9,73	M2	
	TINGGI	=	0,12				
J3 KUSEN	PANJANG	=	9,18	8,00	11,02	M2	
	TINGGI	=	0,15				
DAUN V1 J2 DAN J3	PANJANG	=	1,98	44,00	10,45	M2	
	TINGGI	=	0,12				
JM1	PANJANG	=	18,06	1,00	2,71	M2	
	TINGGI	=	0,15				
JM2	PANJANG	=	17,90	1,00	2,69	M2	
	TINGGI	=	0,15				
				JUMLAH VOLUME		187,31	M2
3	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	PANJANG	=	11,25	2,00	188,30	M2
	ATAS KIRI DAN KANAN	LEBAR	=	8,28			
	BAWAH KIRI KANAN	PANJANG	=	29,35	2,00	66,33	M2
		LEBAR	=	1,13			
	GIMBAL KIRI KANAN	PANJANG	=	18,35	2,00	36,70	M2
		LEBAR	=	1,00			
	ATAP TERAS BELAKANG	PANJANG	=	4,30	1,00	30,10	M2
		LEBAR	=	7,00			
	ATAP UTAMA ATAS	PANJANG	=	13,50	1,00	155,52	M2
		LEBAR	=	11,52			
ATAP UTAMA ATAS	PANJANG	=	0,65	1,00	3,90	M2	
	LEBAR	=	6,00				
ATAP ATAS SIKU	PANJANG	=	3,10	2,00	49,60	M2	
	LEBAR	=	8,00				
(Estimasi kerusakan 5%)				JUMLAH VOLUME		26,42	M2
4	Pek. Pasangan Nok Atap	PANJANG	=	103,78	1,00	103,78	
	NOK ATAP	LEBAR	=	8,28			
		TINGGI	=				
Estimasi Kerusakan 20%				JUMLAH VOLUME		20,76	M1
5	Pek. Memasang Rangka Langit - Langit (50x100) cm	PANJANG	=	-	1,00	65,16	
	RANGKA KAYU	LEBAR	=	-			
		TINGGI	=	-			
10% DARI VOLUME				JUMLAH VOLUME		6,52	M2
6	Pek. Memasang Langit-langit Tripleks uk. 120 x 240 cm	PANJANG	=	7,97	1,00	46,86	M2
	LANTAI 1	LEBAR	=	5,88			
		PANJANG	=	5,88	1,00	8,82	M2
	LANTAI 1	LEBAR	=	1,50			
		PANJANG	=	6,00	1,00	9,48	M2
	LANTAI 2	LEBAR	=	1,58			
		JUMLAH VOLUME		65,16		M2	

7	Pek. Pengecatan Plafond	PANJANG	=	3,88	2,00	22,35	M2
	RUANG FC	LEBAR	=	2,88			
	RUANG	PANJANG	=	3,88	2,00	22,35	M2
		LEBAR	=	2,88			
	RUANG AULA	PANJANG	=	7,97	1,00	46,86	M2
		LEBAR	=	5,88			
	RUANG AULA PART 2	PANJANG	=	5,88	1,00	8,82	M2
		LEBAR	=	1,50			
	TERAS KIRI KANAN	PANJANG	=	10,00	2,00	40,00	M2
		LEBAR	=	2,00			
	GIMBAL KANAN KIRI	PANJANG	=	49,45	2,00	148,35	M2
		LEBAR	=	1,50			
	TERAS BELAKANG	PANJANG	=	12,30	1,00	18,45	M2
		LEBAR	=	1,50			
	KM KANAN KIRI	PANJANG	=	3,88	2,00	15,29	M2
		LEBAR	=	1,97			
	RUANG TENGAH	PANJANG	=	3,88	1,00	20,06	M2
		LEBAR	=	5,17			
	RUANG TENGAH	PANJANG	=	3,00	1,00	7,50	M2
		LEBAR	=	2,50			
	TERAS BELAKANG	PANJANG	=	3,88	1,00	3,88	M2
		LEBAR	=	1,00			
	TERAS DEPAN	PANJANG	=	3,88	1,00	3,88	M2
		LEBAR	=	1,00			
	KAMAR DAPUR	PANJANG	=	3,88	1,00	15,05	M2
		LEBAR	=	3,88			
	KAMAR DAPUR	PANJANG	=	1,00	1,00	2,38	M2
		LEBAR	=	2,38			
	LORONG KANAN	PANJANG	=	7,91	1,00	14,87	M2
		LEBAR	=	1,88			
	LORONG KANAN	PANJANG	=	3,88	1,00	3,88	M2
		LEBAR	=	1,00			
	KAMAR KANAN	PANJANG	=	3,97	1,00	15,40	M2
		LEBAR	=	3,88			
	KAMAR KANAN	PANJANG	=	3,88	1,00	11,17	M2
		LEBAR	=	2,88			
LANTAI 1							
	KAMAR KIRI	PANJANG	=	2,88	4,00	34,56	M2
		LEBAR	=	3,00			
	KAMAR KIRI	PANJANG	=	3,88	1,00	11,64	M2
		LEBAR	=	3,00			
	KORIDOR KIRI	PANJANG	=	6,00	1,00	9,48	M2
		LEBAR	=	1,58			

	RUANG TENGAH	PANJANG LEBAR	= = =	4,00 4,73	1,00	18,92	M2	
	RUANG TENGAH	PANJANG LEBAR	= = =	7,23 3,88	1,00	28,05	M2	
	KAMAR MANDI ATAS	PANJANG LEBAR	= = =	3,88 2,97	1,00	11,52	M2	
	KAMAR ATAS	PANJANG LEBAR	= = =	3,88 2,88	1,00	11,17	M2	
	KAMAR ATAS	PANJANG LEBAR	= = =	1,00 2,38	1,00	2,38	M2	
	KORIDOR KANAN	PANJANG LEBAR	= = =	6,00 1,88	1,00	11,28	M2	
	KORIDOR KANAN	PANJANG LEBAR	= = =	2,88 1,00	1,00	2,88	M2	
	KORIDOR KANAN	PANJANG LEBAR	= = =	1,00 1,00	1,00	1,00	M2	
	RUANG RAPAT	PANJANG LEBAR	= = =	2,00 2,97	1,00	5,94	M2	
	RUANG RAPAT	PANJANG LEBAR	= = =	3,88 3,97	1,00	15,40	M2	
	KAMAR	PANJANG LEBAR	= = =	3,88 2,88	1,00	11,17	M2	
	KAMAR	PANJANG LEBAR	= = =	1,88 2,88	1,00	5,41	M2	
	GIMBAL DAK	PANJANG LEBAR	= = =	21,40 0,70	2,00	29,96	M2	
	GIMBAL ATAP	PANJANG LEBAR	= = =	40,30 0,70	1,00	28,21	M2	
	GIMBAL ATAP	PANJANG LEBAR	= = =	15,00 0,70	2,00	21,00	M2	
	LANTAI 2	JUMLAH VOLUME					680,54	M2
C	PEKERJAAN KAMAR MANDI							
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 60x60 cm Motif KAMAR MANDI BAWAH	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	3,76 1,97	2,00	14,81	M2	
	KAMAR MANDI ATAS	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	2,85 1,88	1,00	5,36		
	KAMAR MANDI ATAS	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	1,97 1,88	1,00	3,70		
	JUMLAH VOLUME					23,88		
2	Pek. Dinding Granit Uk. 60x60 cm Polished KAMAR MANDI BAWAH	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	13,00 1,50	2,00	39,00	M2	
	KAMAR MANDI ATAS	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	10,74 1,50	1,00	16,11		
	KAMAR MANDI ATAS	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	6,90 1,50	1,00	10,35		
	JUMLAH VOLUME					65,46		

3	Pek. Kloset Jongkok Porselen KLOSET	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	4,00 4,00 4,00	BH
4	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 3" PIPA PVC	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	18,00 - -	1,00 18,00 18,00	M1
5	Pek. Pasangan Pipa Type AW Uk. 1/2" PIPA PVC	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	48,00 - -	1,00 48,00 48,00	M1
6	Pek. Pasangan Kran Air Stainless KRAN AIR	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	6,00 6,00 6,00	BH
7	Pek. Pasangan Floor Drain Stainless FLOOR DRAIN	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	6,00 6,00 6,00	BH
D PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN						
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Penerangan INSTALASI	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	1,00 1,00 1,00	TTK
2	Pek. Pemasangan Lampu LED 19 Watt Putih LAMPU	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	10,00 10,00 10,00	BH
3	Pek. Pasangan Stop Kontak STOP KONTAK	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	2,00 2,00 2,00	BH
4	Pek. Pasangan Saklar Tunggal SAKLAR TUNGGAL	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	6,00 6,00 6,00	BH
5	Pek. Pasangan Saklar Ganda SAKLAR GANDA	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	4,00 4,00 4,00	BH
E PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA						
1	Pek. Pasangan Daun Pintu type 2 PINTU 2	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- 0,65 2,00	2,00 2,60 2,60	M2
2	Pek. Pasangan Kunci Pintu 2x Putar (Lever Handle) KUNCI PINTU	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	4,00 4,00 4,00	BH
3	Pek. Pasangan Engsel Pintu ENGSEL PINTU	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	6,00 6,00 6,00	BH
4	Pek. Pull Handle Pintu PULL HANDLE	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	2,00 2,00 2,00	BH
F PEKERJAAN LAIN LAIN						
1	Pek. Sewa Scaffolding Scaffolding	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	1,00 1,00 1,00	Ls
2	Pek. Pembersihan Akhir Lokasi pembersihan	PANJANG LEBAR TINGGI	= = =	- - -	1,00 1,00 1,00	Ls



KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi - Ma. Bulian Km 16 Simp. Sei Duren Kab. Muaro Jambi Telp (0741) 583183-584118

**DOKUMENTASI STUDENT
CENTER**

Pekerjaan :

Renovasi Student Center

Kontrak

B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026

Lokasi :

Kabupaten Muaro Jambi

Tahun Anggaran :

2026

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI



CV. ANUGRAH

Jasa Pelaksana Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha : BG002, BG006, BS001, BS004
Jl. Padang Lamo Kelurahan Pulau Temiang RT. 02 RW. 01 Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo Provinsi Jambi
Email : cvanugrah161618@gmail.com
No. Rek BANK BPD : 3003095998



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 0%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 0%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 0%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 5%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 10%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 10%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 15%




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 15%

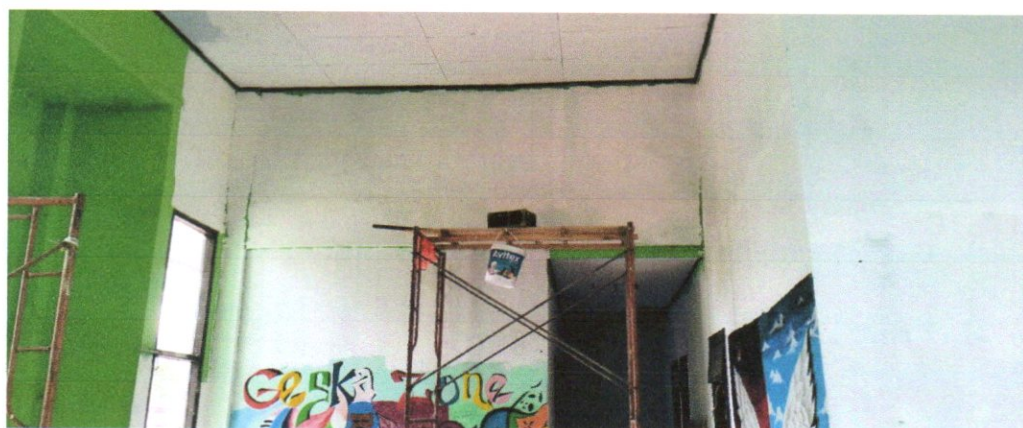

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 20%




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 25%

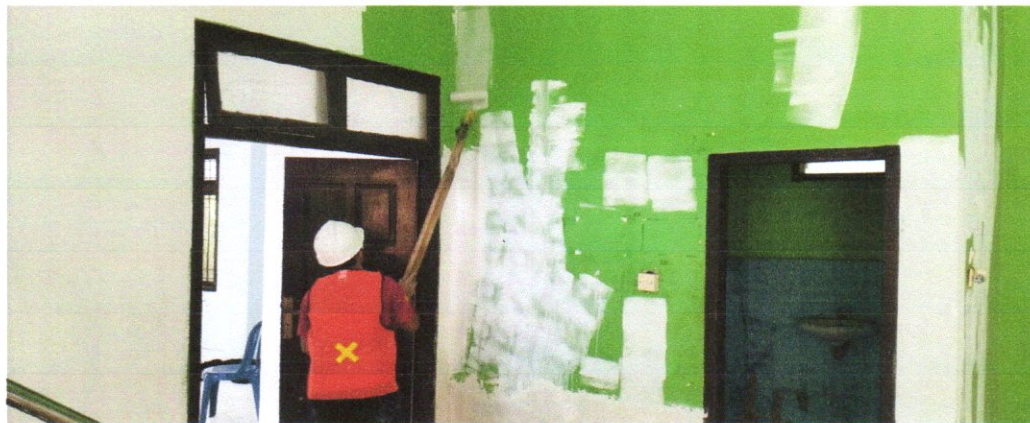

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 25%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 40%




Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 40%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

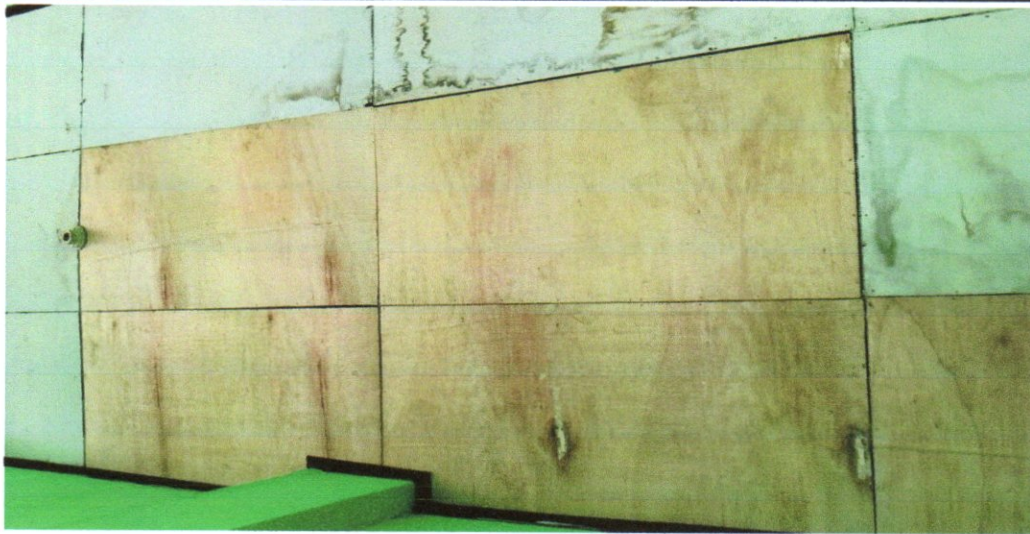

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 40%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 40%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 40%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 50%




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 50%

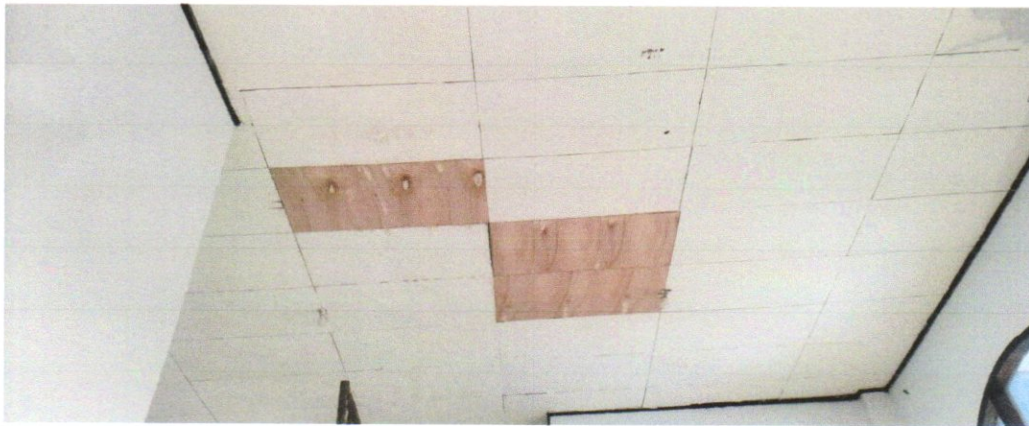


Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 50%




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

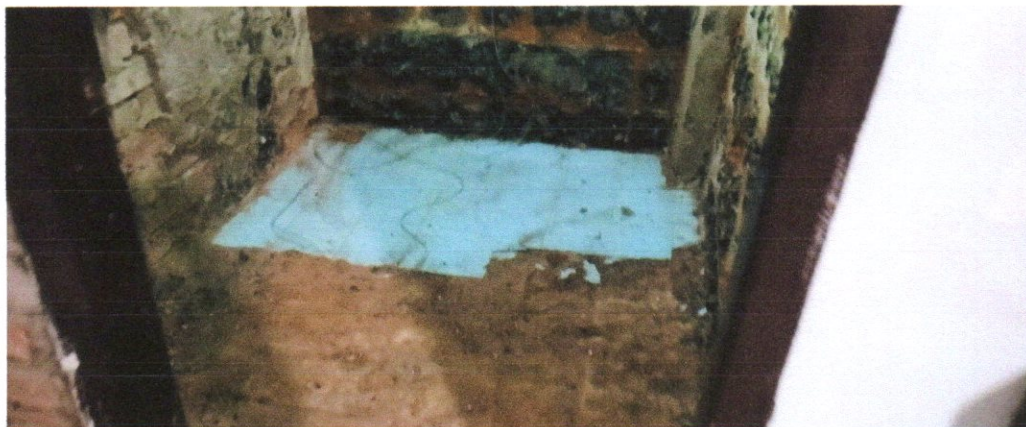

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 60%

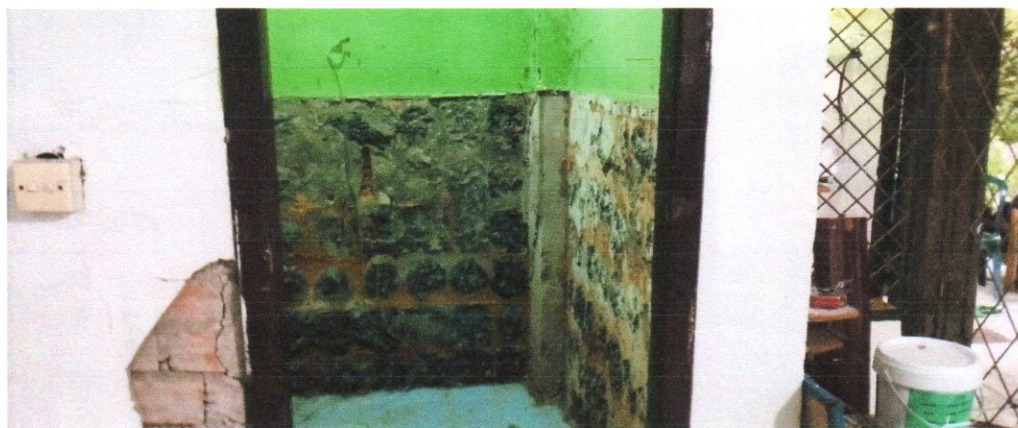

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 60%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 100%




Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 100%




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

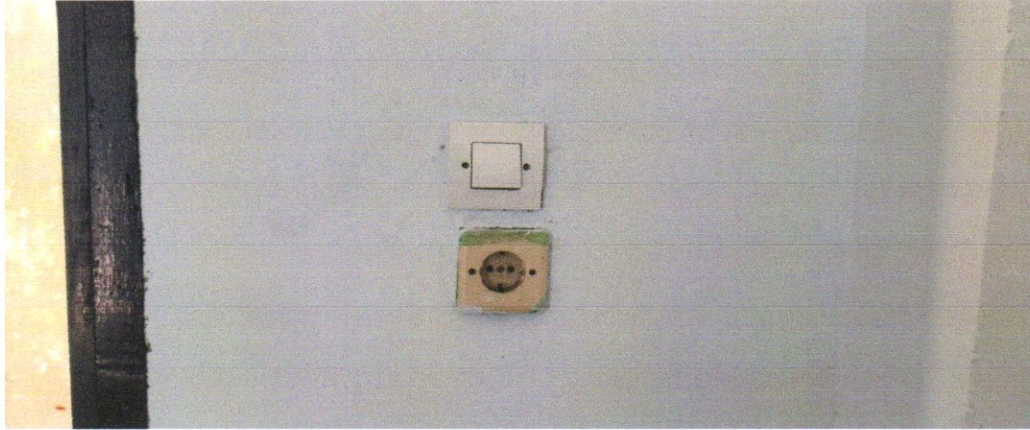

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 90%

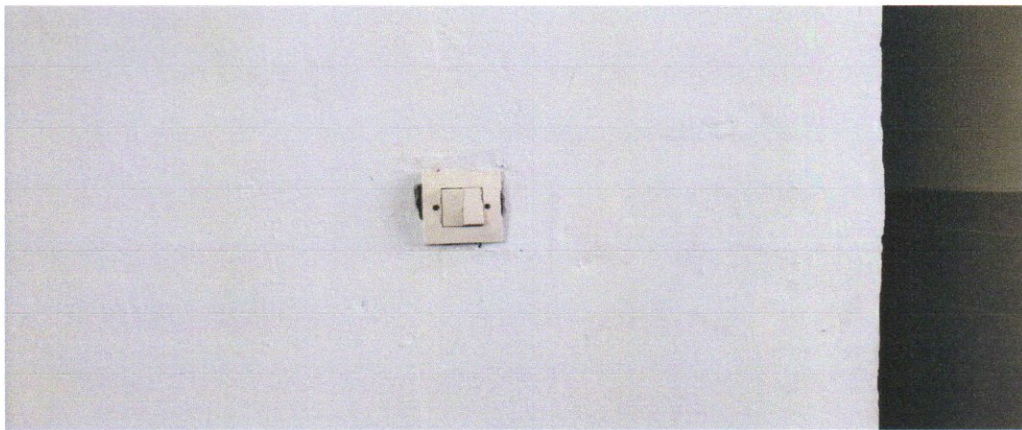

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 90%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI


JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN

KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 90%

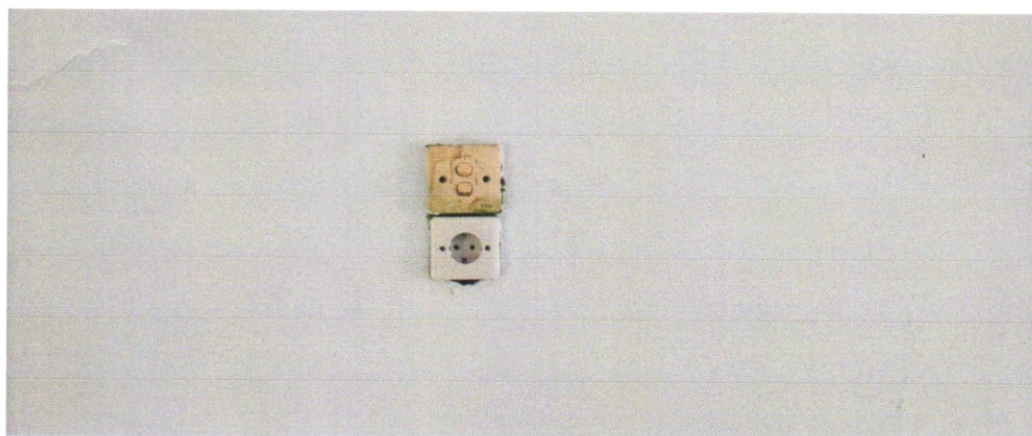

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 90%




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 80%

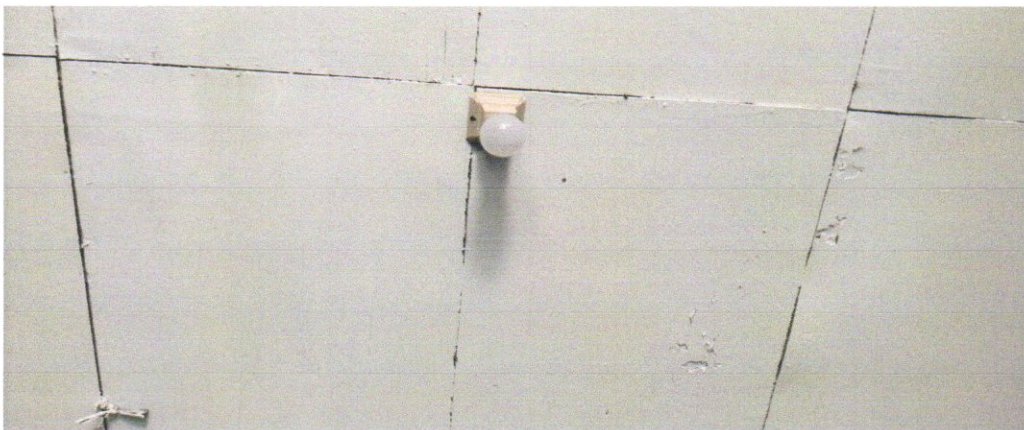


Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 80%




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

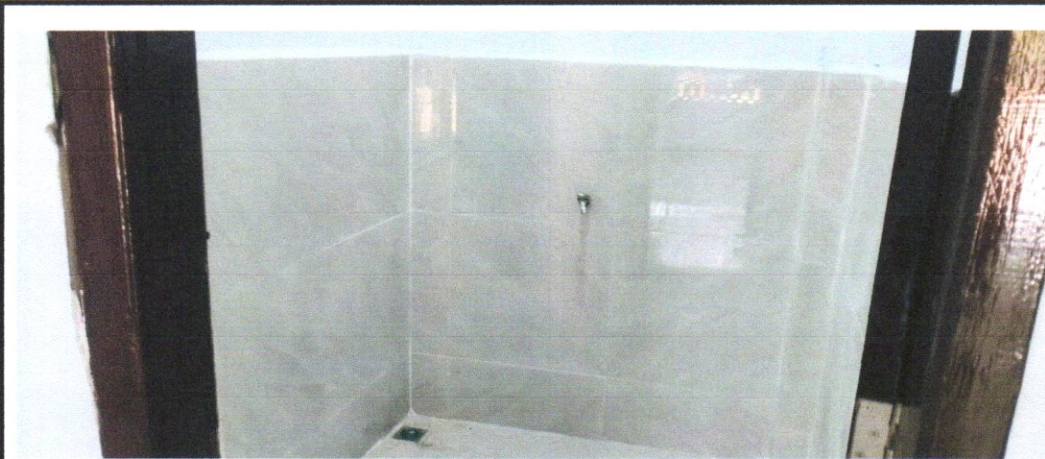

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 80%

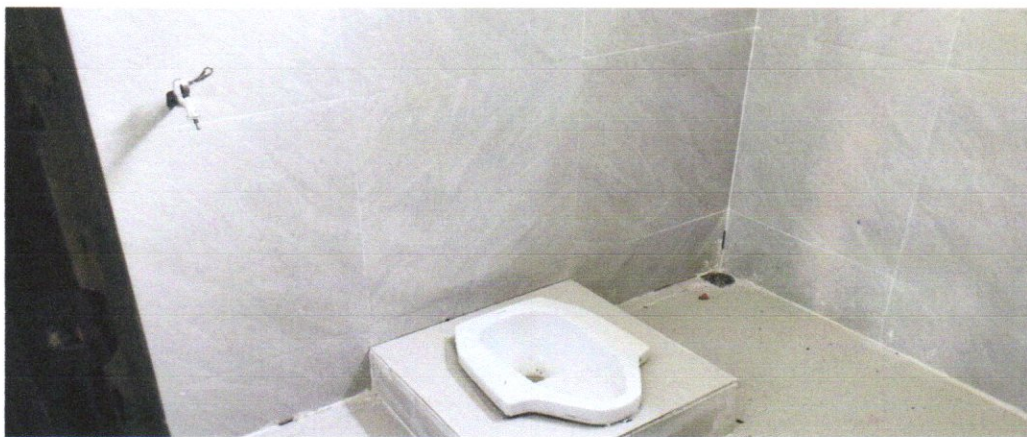


Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 80%




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

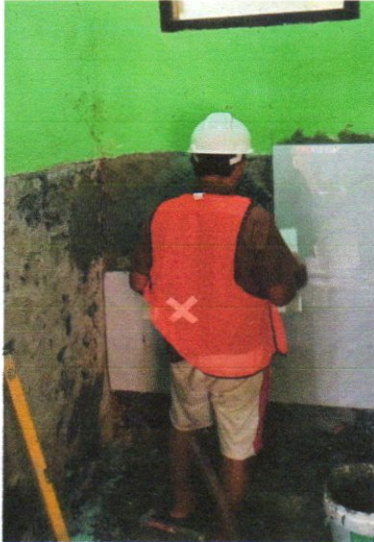

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 70%

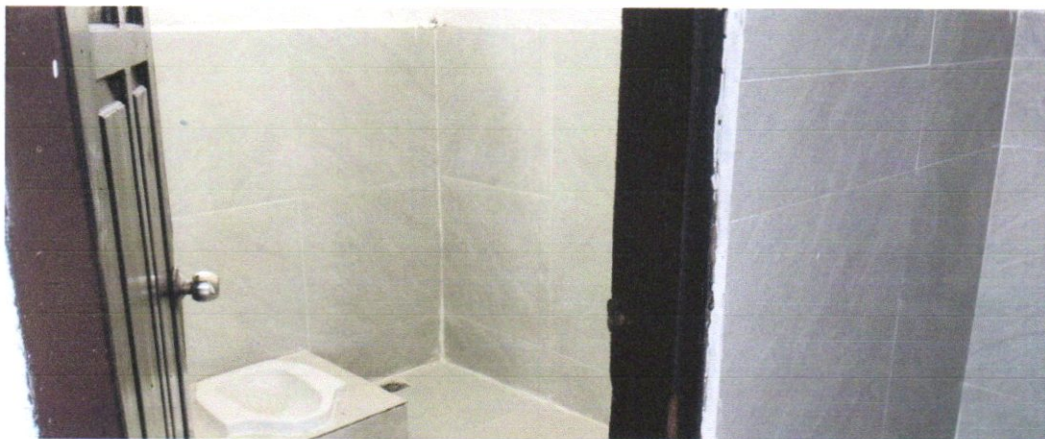

Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 70%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 100%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 100%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 100%



Pekerjaan : Renovasi Student Center
pelaksana : CV. Anugrah

Dokumentasi : 100%
